

À
Prefeitura Municipal de Sobral - CE
A/C: Sr. Pregoeiro

Ref.: Pregão Presencial nº 065/2017

CARTA PROPOSTA

VERTICAL GREEN DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.389.477/0001/07, sediada no endereço constante no rodapé desta, neste ato representada por sua sócia administradora Sr^a Isabel Cristina de Oliva Coelho, portadora do RG nº 1223636 SSP-GO e do CPF nº 251.764.041-68, vem apresentar ao Sr. Pregoeiro a presente proposta comercial, que encontra-se em conformidade com as informações previstas no Edital e seus anexos.

1. IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE:

Razão Social: VERTICAL GREEN DO BRASIL LTDA

CNPJ: 03.389.477/0001-07 ✓

Inscrição Estadual: 10.320.010-0

Endereço completo: Rua 2 Qd. 9, Mód. R-35, Distrito Agroindustrial, Senador Canedo/GO, CEP 75.252-290

Representante Legal: *Rosamete Carneiro de Oliveira, CPF. 028.088.703.76*
~~Isabel Cristina de Oliva Coelho, RG-1223636-SSP-GO, CPF-251.764.041-68~~

E-mail: jorge@verticalgreen.com.br

Fone: (62) 3095-1999

Dados bancários: Banco do Brasil (001), Agência 4679, Conta Corrente: 512.860-9

2. CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA:


A presente proposta é válida por 60 (sessenta) dias, contados da data de sua emissão. O objeto contratual terá a garantia conforme legislação específica, quando aplicável.

3. FORMAÇÃO DO PREÇO


Item	Insumo	Natureza do Serviço	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Parcial	Total
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					10.778,04
1.1	C1937	PLACA PADRÃO DE OBRA	M2	84,00	128,31	10.778,04	
2.0		SERVIÇOS DIVERSOS					1.870.688,99
2.1	C3526	LIMPEZA MANUAL DE AGUAPÉS EM LAGOAS	M2	386.578,50	1,83	707.438,66	
2.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	13.590,00	2,28	30.985,20	
2.3	C3212	ESCAVAÇÃO E CARGA DE SOLO MOLE	M3	8.154,00	9,12	74.364,48	
2.4	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	40.016,85	2,65	106.044,65	
2.5	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5KM	M3	48.170,85	19,76	951.856,00	
					Total Parcial		1.881.467,03
					BDI %	20,97%	394.543,64
					Total Geral		2.276.010,67

VALOR GLOBAL DO LOTE: **RS 2.276.010,67** (Dois milhões e duzentos e setenta e seis mil e dez Reais e sessenta e sete centavos).

Senador Canedo/GO, 20 de outubro de 2017.



VERTICAL GREEN DO BRASIL LTDA
Isabel Cristina de Oliva Coelho





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Ref.: Pregão Presencial nº 065/2017

ITEM	INSUMO	NATUREZA DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					10.778,04
1.1	C1937	PLACA PADRÃO DE OBRA	M2	84	128,31	10.778,04	
2.0		SERVIÇOS DIVERSOS					1.870.688,99
2.1	C3526	LIMPEZA MANUAL DE AGUAPÊS EM LAGOAS	M2	386.578,50	1,83	707.438,66	
2.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	13.590,00	2,28	30.985,20	
2.3	C3212	ESCAVAÇÃO E CARGA DE SOLO MOLE	M3	8.154,00	9,12	74.364,48	
2.4	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	40.016,85	2,65	106.044,65	
2.5	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5KM	M3	48.170,85	19,76	951.856,00	
					TOTAL PARCIAL		1.881.467,03
					BDI %	20,97%	394.543,64
					TOTAL GERAL		2.276.010,67

Senador Canedo/GO, 20 de outubro de 2017



vertical
green
do Brasil

VERTICAL GREEN DO BRASIL LTDA

CNPJ: 03.389.477/0001-07

Isabel Cristina de Oliva Coelho

Sócia Administradora



3

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Ref.: Pregão Presencial nº 065/2017

			30 DIAS				60 DIAS				90 DIAS				
		VR. TOTAL	PREVISÃO		ACUMULADO		PREVISÃO		ACUMULADO		PREVISÃO		ACUMULADO		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.778,04	100,00%	10.778,04	100,00%	10.778,04	0,00%	0	100,00%	10.778,04	0,00%	0	100,00%	10.778,04
2	.0	SERVIÇOS DIVERSOS	1.870.688,99	7,85%	146.849,09	7,85%	146.849,09	8,37%	156.576,67	16,22%	303.425,75	8,37%	156.576,67	24,59%	460.002,42
		TOTAL PARCIAL.....R\$	1.881.467,03	8,38%	157.666,94	8,38%	157.666,94	8,32%	156.538,06	16,70%	314.204,99	8,32%	156.538,06	25,02%	470.743,05
		BDI 20,97%.....R\$	394.543,64	8,38%	33.062,76	8,38%	33.062,76	8,32%	32.826,03	16,70%	65.989,79	8,32%	32.826,03	25,02%	98.714,82
		TOTAL GERAL.....R\$	2.276.010,67	8,38%	190.729,69	8,38%	190.729,69	8,32%	189.364,09	16,70%	380.093,78	8,32%	189.364,09	25,02%	569.457,87

			120 DIAS				160 DIAS				180 DIAS				
		VR. TOTAL	PREVISÃO		ACUMULADO		PREVISÃO		ACUMULADO		PREVISÃO		ACUMULADO		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.778,04	0,00%	0	100,00%	10.778,04	0,00%	0	100,00%	10.778,04	0,00%	0	100,00%	10.778,04
2	.0	SERVIÇOS DIVERSOS	1.870.688,99	8,37%	166.576,67	32,96%	616.579,10	8,38%	156.763,74	41,34%	773.342,84	8,38%	156.763,74	49,72%	930.106,58
		TOTAL PARCIAL.....R\$	1.881.467,03	8,32%	156.576,67	33,34%	627.357,14	8,33%	156.763,74	41,88%	784.120,88	8,33%	156.763,74	50,01%	940.884,62
		BDI 20,97%.....R\$	394.543,64	8,32%	33.115,97	33,34%	132.686,05	8,33%	33.155,53	41,88%	165.841,58	8,33%	33.155,53	60,01%	188.997,11
		TOTAL GERAL.....R\$	2.276.010,67	8,32%	189.692,64	33,34%	760.043,19	8,33%	189.919,27	41,88%	949.962,46	8,33%	189.919,27	60,01%	1.138.881,73

			210 DIAS				240 DIAS				270 DIAS				
		VR. TOTAL	PREVISÃO		ACUMULADO		PREVISÃO		ACUMULADO		PREVISÃO		ACUMULADO		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.778,04	0,00%	0	100,00%	10.778,04	0,00%	0	100,00%	10.778,04	0,00%	0	100,00%	10.778,04
2	.0	SERVIÇOS DIVERSOS	1.870.688,99	8,38%	156.763,74	58,10%	1.086.870,30	8,38%	156.763,74	66,48%	1.243.634,04	8,38%	156.763,74	74,86%	1.400.397,78
		TOTAL PARCIAL.....R\$	1.881.467,03	8,33%	156.726,20	58,34%	1.087.647,87	8,33%	156.726,20	66,67%	1.254.374,07	8,33%	156.726,20	75,00%	1.411.100,27
		BDI 20,97%.....R\$	394.543,64	8,33%	32.865,48	58,34%	230.176,76	8,33%	32.865,48	66,67%	263.042,24	8,33%	32.865,48	75,00%	295.907,73
		TOTAL GERAL.....R\$	2.276.010,67	8,33%	189.591,69	58,34%	1.327.824,62	8,33%	189.591,69	66,67%	1.517.416,31	8,33%	189.591,69	75,00%	1.707.008,00

			300 DIAS				330 DIAS				365 DIAS				
		VR. TOTAL	PREVISÃO		ACUMULADO		PREVISÃO		ACUMULADO		PREVISÃO		ACUMULADO		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.778,04	0,00%	0	100,00%	10.778,04	0,00%	0	100,00%	10.778,04	0,00%	0	100,00%	10.778,04
2	.0	SERVIÇOS DIVERSOS	1.870.688,99	8,38%	156.763,74	83,24%	1.557.161,52	8,38%	156.763,74	91,62%	1.713.925,25	8,38%	156.763,74	100,00%	1.870.688,99
		TOTAL PARCIAL.....R\$	1.881.467,03	8,33%	156.726,20	83,34%	1.558.014,52	8,33%	156.726,20	91,67%	1.724.740,83	8,33%	156.726,20	100,00%	1.881.467,03
		BDI 18,58%.....R\$	394.543,64	8,33%	32.865,48	83,34%	328.812,67	8,33%	32.865,48	91,67%	361.678,15	8,33%	32.865,48	100,00%	394.543,64
		TOTAL GERAL.....R\$	2.276.010,67	8,33%	189.591,69	83,34%	1.896.827,29	8,33%	189.591,69	91,67%	2.086.418,98	8,33%	189.591,69	100,00%	2.276.010,67

Senador Canedo/GO, 20 de outubro de 2017.



Isabel Cristina de Oliva Coelho

VERTICAL GREEN DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 03.389.477/0001-07
 Isabel Cristina de Oliva Coelho
 Sócia Administradora




Handwritten marks and initials



ESTADO DO CEARÁ		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL		
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
ANEXO B		
SERVIÇO: LIMPEZA DE LAGOAS, CANAIS RIOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO		
DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I.		
I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO		
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)		3,00%
II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO (PREÇO DE VENDA DO SERVIÇO)		
1 - IMPOSTOS (I)		
1.1 - COFINS	3,00%	
1.2 - PIS	0,65%	
1.3 - ISS	2,00%	
1.4 - CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)	0,00%	
		5,65%
III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE CUSTO		
2 - LUCRO (L)		8,30%
3 - GARANTIA (G)		0,40%
4 - RISCO (R)		0,97%
5 - SEGURO (S)		0,40%
6 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)		0,59%
III - CÁLCULO DO B.D.I.		
$B D I = \frac{(((1+(AC+S+R+G)) \times (1+DF)) \times (1+L))}{(1+I)} - 1 \times 100$		
B D I %		20,97%

Senador Canedo/GO, 20 de outubro de 2017




 VERTICAL GREEN DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 03.389.477/0001-07
 Isabel Cristina de Oliva Coelho
 Sócia Administradora



CARTA PROPOSTA

À

Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Sobral

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL nº 065/2017 / processo nº P001457/2017

A proposta comercial encontra-se em conformidade com as informações previstas no Edital e seus anexos.

1. Identificação do Licitante:

- Razão Social: MC PARENTE PREMOLDADOS LTDA
- CNPJ: 09.620.624/0001-86 - CGF: 06.367.962-0
- Endereço completo: Rodovia Br 222, Km 233, S/N
- Representante Legal (Marcelo Catunda Parente Filho, Brasileiro, Casado, Empresário, RG: 2006031020275, CPF: 410.865.056-00, Rua Eva, 740):
- Telefone: (88) 3611-5785, celular (88) 99628-0123, e-mail: mcpremoldados@mcpremoldados.com.br
- Caixa Econômica Federal, agência: 0554, operação: 003, conta corrente: 2637-6

2. Condições Gerais da Proposta:

A presente proposta é válida por 60 (sessenta) dias, contados da data de sua emissão.

O objeto contratual terá a garantia de 12 (doze meses) - 365 (trezentos e sessenta e cinco dias)

3. Formação do Preço

LOTE ÚNICO					
Item	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
	Limpeza de lagoas, canais e rios na sede do Município de Sobral.	UND	01	R\$: 2.005,757,81	R\$: 2.005,757,81
VALOR GLOBAL DO LOTE R\$: 2.005.757,81 (Dois Milhões, Cinco Mil, Setecentos e Cinquenta e Sete Reais e Oitenta e Um Centavos)					

Sobral, 24 de Outubro de 2017.

MC PARENTE PREMOLDADOS LTDA
CNPJ: 09.620.624/0001-86

Fco. Marcos Ximenes Carneiro
Engenheiro Civil
CREA-CE 13092D/RN 060366782-1

MC PARENTE PREMOLDADOS LTDA
CNPJ: 09.620.624/0001-86


Marcelo Catunda Parente Filho
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 410.865.056-00

M. C. PARENTE PREMOLDADOS LTDA. • CNPJ: 09.620.624/0001-86 - C.G.F. 06.367.962-0
Rod. BR 222, Km 233 - Sobral - CE - Alto do Angico
Fone/Fax: **(88) 3611.5785** - Sobral - Ceará
www.mcpremoldados.com.br

MC PARENTE PREMOLDADOS LTDA
 CNPJ: 09.620.624/0001-86

Rodovia BR 222, Km 233, Bairro Alto do Angico, S/N - Sobral/CE

SERVIÇO: LIMPEZA DE LAGOAS, CANAIS E RIOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO		FONTE: SEINFRA VERSÃO 24.1				
LOCAL: SOBRAL - CE		ORÇAMENTO BÁSICO				
NATUREZA DO SERVIÇO		CONTRATO				
ITEM	INSUMO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	R\$ TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	C1937 PLACA PADRÃO DE OBRA	M²	84,00	R\$ 112,91	R\$ 9.484,44	R\$ 9.484,44
2.0	SERVIÇOS DIVERSOS					
2.1	C3526 LIMPEZA MANUAL DE AGUAPÉS EM LAGOAS	M²	386578,50	R\$ 1,61	R\$ 622.391,39	
2.2	C2102 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M²	13590,00	R\$ 2,01	R\$ 27.315,90	
2.3	C3212 ESCAVAÇÃO E CARGA DE SOLO MOLE	M³	8154,00	R\$ 8,03	R\$ 65.476,62	
2.4	C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M³	40016,85	R\$ 2,33	R\$ 93.239,26	
2.5	C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5KM	M³	48170,85	R\$ 17,39	R\$ 837.691,08	
			TOTAL PARCIAL			R\$ 1.655.598,69
				B.D.N(21,15%)		R\$ 350.159,12
				TOTAL GERAL		R\$ 2.005.757,81



MC PARENTE PREMOLDADOS LTDA
 CNPJ: 09.620.624/0001-86

Marcelo Catunda Parente Filho
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 410.056.863-00

MC PARENTE PREMOLDADOS LTDA
 CNPJ: 09.620.624/0001-86

Lucas Marcos Ximenes Carneiro
 Engenheiro Civil
 INSC. CE 130920/RN 060366782-1

MC PARENTE PREMOLDADOS LTDA
 CNPJ: 09.620.624/0001-86
 Rodovia BR 222, Km 233, Bairro Alto do Angico, S/N - Sobral/CE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

UBRA: LIMPEZA DE LAGOAS, CANAIS E RIOS NA SEDE DO MUNICÍPIO
 LOCAL: SOBRAL - CE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		ACUMULADO	
		%	RS	%	RS	%	RS	%	RS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	9.484,44	100%	9.484,44	0%	0	0%	9.484,44
2.0	SERVIÇOS DIVERSOS	7,85%	129.219,97	8,37%	137.779,76	8,37%	137.779,76	8,37%	137.779,76
	TOTAL PARCIAL	8,37%	138.704,41	8,37%	137.779,76	16,70%	275.554,20	8,37%	137.779,76
	B.D.(21,15%)	8,37%	29.335,98	8,37%	29.140,42	16,70%	58.476,40	8,37%	29.140,42
	TOTAL GERAL	8,37%	168.040,39	8,37%	166.920,18	16,70%	334.030,60	8,37%	166.920,18

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		ACUMULADO	
		%	RS	%	RS	%	RS	%	RS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
2.0	SERVIÇOS DIVERSOS	8,37%	137.779,76	32,96%	542.559,26	8,38%	137.944,37	41,34%	680.503,63
	TOTAL PARCIAL	8,37%	137.779,76	33,34%	542.559,26	8,38%	137.944,37	49,72%	680.503,63
	B.D.(21,15%)	8,37%	29.335,98	33,34%	542.559,26	8,38%	137.944,37	50,01%	680.503,63
	TOTAL GERAL	8,37%	167.115,74	33,34%	542.559,26	8,38%	137.944,37	50,01%	680.503,63

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		ACUMULADO	
		%	RS	%	RS	%	RS	%	RS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
2.0	SERVIÇOS DIVERSOS	8,38%	137.944,37	58,10%	955.392,38	8,39%	137.944,37	66,67%	1.103.321,19
	TOTAL PARCIAL	8,38%	137.944,37	58,10%	955.392,38	8,39%	137.944,37	75,00%	1.103.321,19
	B.D.(21,15%)	8,38%	29.175,24	58,10%	955.392,38	8,39%	137.944,37	75,00%	1.103.321,19
	TOTAL GERAL	8,38%	167.119,61	58,10%	955.392,38	8,39%	137.944,37	75,00%	1.103.321,19


ITEM	DISCRIMINAÇÃO	300 DIAS		330 DIAS		365 DIAS		ACUMULADO	
		%	RS	%	RS	%	RS	%	RS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
2.0	SERVIÇOS DIVERSOS	8,33%	137.944,37	83,24%	1.370.225,50	8,38%	137.944,37	91,62%	1.508.169,88
	TOTAL PARCIAL	8,33%	137.944,37	83,24%	1.370.225,50	8,38%	137.944,37	91,62%	1.508.169,88
	B.D.(21,15%)	8,33%	29.175,24	83,24%	1.370.225,50	8,38%	137.944,37	91,62%	1.508.169,88
	TOTAL GERAL	8,33%	167.119,61	83,24%	1.370.225,50	8,38%	137.944,37	91,62%	1.508.169,88

MC PARENTE PREMOLDADOS LTDA
 CNPJ: 09.620.624/0001-86

Fco. Marcos Ximenes Carneiro
 Engenheiro Civil
 REA-CE 130920/RN 060366782-1

MC PARENTE PREMOLDADOS LTDA
 CNPJ: 09.620.624/0001-86

Marcelo Catunda Parente Filho
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 410.059.855-90

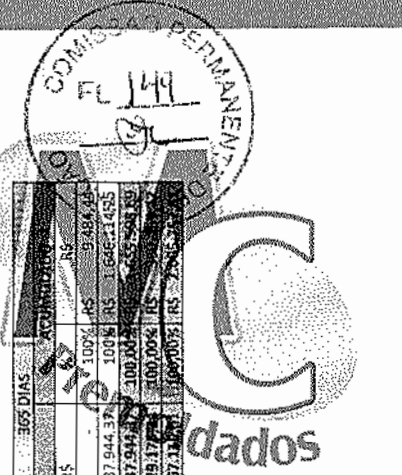

M. C. PARENTE PREMOLDADOS LTDA. • CNPJ: 09.620.624/0001-86 - C.G.F. 06.367.962-0
 Rod. BR 222, Km 233 - Sobral - CE - Alfo do Angico
 Fonte/Fax: (88) 3611.5785 - Sobral - Ceará
 www.mcpremolddados.com.br

ESTADO DO CEARÁ					
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL		ACÓRDÃO TCU 2622			
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
ANEXO B					
OBJETO: LIMPEZA DE LAGOAS, CANAIS RIOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO					
DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - 21,15%					
PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO					
			VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA		
			CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	1º Quartil	Médio
			ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%	4,00%
	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%			3º Quartil
					5,50%
PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO (PREÇO DE VENDA DO BDI)					
IMPOSTOS (I)			IMPOSTOS		
	1.1 - COFINS	3,00%			
	1.2 - PIS	0,65%			
	1.3 - ISS	2,00%	7,65%		
	1.4 - CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)	2,00%			

M. C. PARENTE PREMOLDADOS LTDA
 CNPJ: 09.620.624/0001-86
 Fco. Marcos Ximenes Carneiro
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 13092D/RN 060366782-1

MC PARENTE PREMOLDADOS LTDA
 CNPJ: 09.620.624/0001-86
 Marcelo Catunda Parente Filho
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 410.056.803-00

